



BERNARDO V. USCA ZAMORA
CONSULTOR & CONSTRUCTOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°.

61

FECHA: lunes 06/01/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Rotura de Contrapiso.
- Picado de Piso
- Excavación manual
- Desalojo de material con volqueta
- Montaje y soldadura de correas, 6 150 x 50 x 15 x 3

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	-	Eq. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	03	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	01	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	01	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	01	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	01	Botomartillo
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	-	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	-	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
MAÑANA (6:00-11:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:


5.- PERSONAL EN OBRA:

01	Residente de Obra	01	Maestro mayor	01	Albañil (es)	-	Soldador
01	Ing Ambiental	01	Peón (es)	-	Electricista	-	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

Fiscalización ambiental
dispositivo reubicar el letrero
informativo de obra al ingreso
de la cancha cubierta, suspendido
mediante cables

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

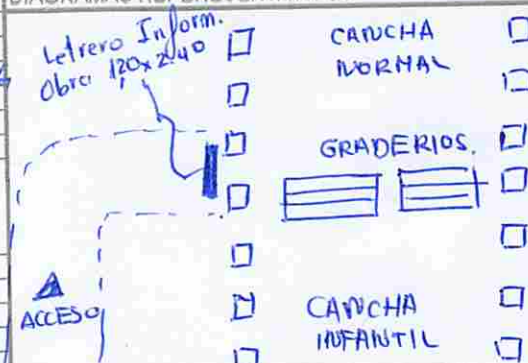

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN E. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N° 62

FECHA: Martes 07/01/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Montaje y soldadura de correas G 150X50X15X3.
- Tubería de petróleo 3 1/2" estructura de grader (corte, sueldo, pintura y montaje).

2.- EQUIPO UTILIZADO:

X	Herramienta menor	-	Eqp. topográfico	X	Cono de seguridad	03	Adamios
-	Concretera	-	Retro excavadora	X	Cinta de peligro	01	Equipo de sold.
-	Vibrador	-	Volqueta	X	EPP	-	-
-	Vibroapisonador	-	Bomba de agua	01	Compresor	-	-

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)			X		
MANANA (6:00-11:59)		X			
TARDE (12:00-17:59)					X
NOCHE (18:00-23:59)					

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:


5.- PERSONAL EN OBRA:

01	Residente de Obra	01	Maestro mayor	01	Albañil (es)	-	Soldador
01	Ing Ambiental	01	Peón (es)	-	Electricista	-	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

Fiscalización autoriza el cambio de la configuración estructural de los graderos en tubo de petróleo de 3 1/2"

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

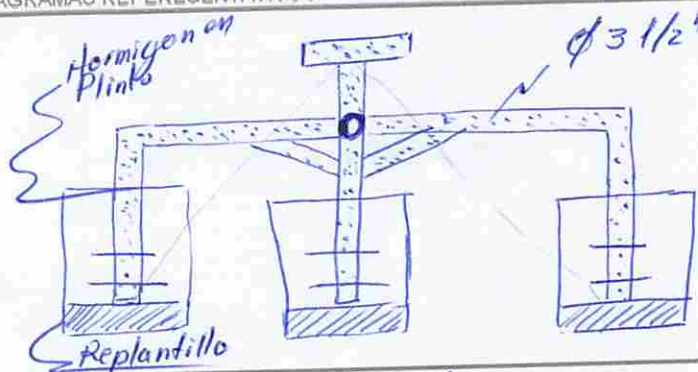

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°-

63

FECHA: Viernes 08/01/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Montaje y soldadura de correas 6 150x50x15x3.
- Tubería de petróleo 3 1/2" estructura de grada (corte, suelda, pintura y montaje)

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input type="checkbox"/>	Eq. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	03	Adamios
<input type="checkbox"/>	Concreteira	<input type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	01	Equipo de sold.
<input type="checkbox"/>	Vibrador	<input type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	-	-
<input type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input type="checkbox"/>	Bomba de agua	01	Compresor	-	-

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
MANANA (6:00-11:59)				<input checked="" type="checkbox"/>	
TARDE (12:00-17:59)				<input checked="" type="checkbox"/>	
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:


5.- PERSONAL EN OBRA:

01	Residente de Obra	01	Maestro mayor	01	Albañil (es)	01	Soldador
01	Ing Ambiental	01	Peón (es)	-	Electricista	-	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

Fiscalización y autorizo la construcción de una canal recolector de Aguas lluvias en el ingreso del edificio de la antigua cubierta

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

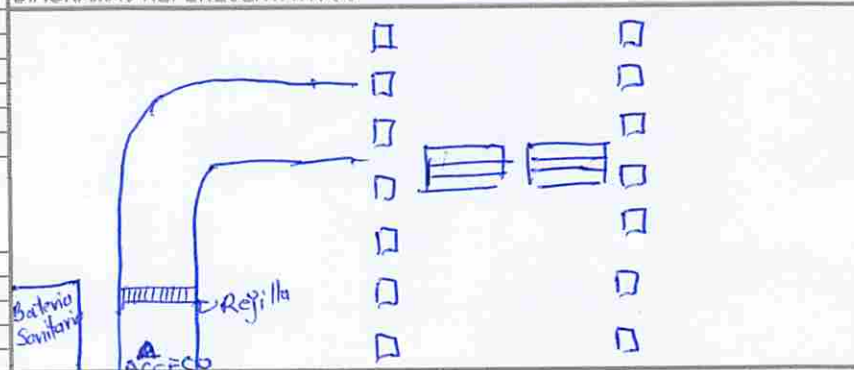

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°- 64

FECHA: 09/01/2025
CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE
FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE
FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO
ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Montaje y soldadura de correas 6 150x50x75x3
- Tuberia de petroleo 3 1/2" estructural de grado (corte, suelta, pintura y montaje).

2.- EQUIPO UTILIZADO:

Herramienta menor	Egp. topográfico	Cono de seguridad	Adamios
Concreteira	Retro excavadora	Cinta de peligro	Equipo de sold.
Vibrador	Volqueta	EPP	
Vibroapisonador	Bomba de agua	Compresor	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	X				
MANANA (6:00-11:59)		X			
TARDE (12:00-17:59)					
NOCHE (18:00-23:59)				X	

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

01 Residente de Obra	01 Maestro mayor	01 Albañil (es)	02 Soldador
01 Ing Ambiental	01 Peón (es)	- Electricista	- Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N° 65

FECHA: Viernes 10/01/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Tuberia de petroleo 3 1/2" estructura de grada (corte, suelta, pintura y montaje)
- Hormigon simpk. $f'c = 140 \text{ Kg/cm}^2$ en replanchillos $\bar{c} = 10 \text{ cm}$.
- Acero de refuerzo $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input type="checkbox"/>	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concreteira	<input type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input type="checkbox"/>	Compresor	<input type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MAÑANA (6:00-11:59)				<input checked="" type="checkbox"/>	
TARDE (12:00-17:59)					<input checked="" type="checkbox"/>
NOCHE (18:00-23:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input type="checkbox"/>	Electricista	<input type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPERESNTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°- 66

FECHA: Sábado 11/01/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Hormigón simple $f'c = 140 \text{ Kg/cm}^2$ en replantillos $E = 10 \text{ cm}$
- Acero de refuerzo $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$
- Hormigón simple $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ en plintas (incluye encofrado)
- Mampostería de bloque $E = 10 \text{ cm}$

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input checked="" type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	<input checked="" type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MANANA (6:00-11:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:


5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

Fiscalización autoriza la
fundación de la mampostería
en el nivel indicado en
los diagramas.

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

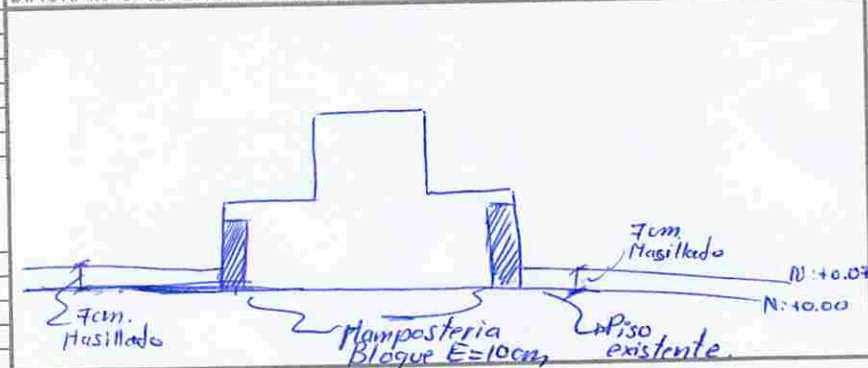

7.- OBSERVACIONES:

El nivel de fundación de la
mampostería de la primera
con trabe de la gradería
es 7cm bajo el masillado que
se proyecta ejecutar.

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N° 67

FECHA: Domingo 12/01/2025
CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE
FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE
FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO
ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Hormigón simple $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ en pilotes
- Mampostería de bloque $E = 10 \text{ cm}$.
- Acero de refuerzo $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$.
- Obras de seguridad y ambiente.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input type="checkbox"/>	Eq. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input type="checkbox"/>	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	<input type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input type="checkbox"/>	Compresor	<input type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
MANANA (6:00-11:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input type="checkbox"/>	Electricista	<input type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N° 68

FECHA: lunes 13/01/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Mamposteria de bloque E=10cm.
- Hormigon simple en loseta E=10cm.
- Espolvoreado y alisado de loseta de granitos.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	-	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	-	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	-	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	-	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	-	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	-	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	-	-

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MAÑANA (6:00-11:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N° 69

FECHA: Martes 14/01/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

Mamposteria a bloque E=10cm.

Aceiro a refuerzo $F_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input checked="" type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adornos
<input checked="" type="checkbox"/>	Concreteira	<input checked="" type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MANANA (6:00-11:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N° 70

FECHA: Miércoles 15/01/2025
CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE
FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE
FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO
ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Hampostea de bloque E=10cm.
- Hormigón simple en loseta E=10cm
- Espolvoreado y alisado de loseta de gradivos.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input type="checkbox"/>	Eq. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input type="checkbox"/>	Adamios
<input type="checkbox"/>	Concreteira	<input type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input type="checkbox"/>	Vibrador	<input type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input type="checkbox"/>	Compresor	<input type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MANANA (6:00-11:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input type="checkbox"/>	Soldador
<input type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input type="checkbox"/>	Peón (es)	<input type="checkbox"/>	Electricista	<input type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO Z. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°.

71

FECHA: 16/01/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Mamposteria de bloque $E=10\text{ cm}$
- Acero de refuerzo $f_y=4200\text{ Kg/cm}^2$
- Hormigon simple en loseta $E=10\text{ cm}$
- Espolvoreado y alisado de loseta de gradenes.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	-	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	-	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	-	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	-	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	-	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	-	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	-	-

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MANANA (6:00-11:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)					<input checked="" type="checkbox"/>

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	-	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	-	Electricista	-	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPERESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°- 72

FECHA: Viernes 17/01/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Entalado vertical paleteado.
- Hormigón Ciclopeo f'c= 130 Kg/lcm 40% y piedra bola 60%.
incluye encofrado

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input checked="" type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	<input checked="" type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)				<input checked="" type="checkbox"/>	
MANANA (6:00-11:59)				<input checked="" type="checkbox"/>	
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°- 13

FECHA: Sábado 18/04/2025
CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE
FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE
FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO
ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Entuerto vertical pulteado de gradierias.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input type="checkbox"/>	Adamios
<input type="checkbox"/>	Concreteira	<input type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input type="checkbox"/>	Vibrador	<input type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input type="checkbox"/>	Compresor	<input type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
MAÑANA (6:00-11:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:


<u>01</u>	Residente de Obra	<u>01</u>	Maestro mayor	<u>02</u>	Albañil (es)	<input type="checkbox"/>	Soldador
<u>01</u>	Ing Ambiental	<u>02</u>	Peón (es)	<input type="checkbox"/>	Electricista	<input type="checkbox"/>	Carpintero


6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPERESNTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:


ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA


ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR


ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°- 74

FECHA: Domingo 19/01/2025
CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE
FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE
FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO
ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Mantenimiento de equipos
- Limpieza de Obra
- Inventario de bodega.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input checked="" type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concreteira	<input checked="" type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MANANA (6:00-11:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
TARDE (12:00-17:59)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)					

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<u>01</u>	Residente de Obra	<u>01</u>	Maestro mayor	<u>02</u>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<u>01</u>	Ing Ambiental	<u>02</u>	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPERESNTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N° 75

FECHA: Lunes 20/01/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

Entuado vertical, pleteado de graderios.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input checked="" type="checkbox"/>	Eq. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concreteira	<input checked="" type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MAÑANA (6:00-11:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

01	Residente de Obra	01	Maestro mayor	02	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
01	Ing Ambiental	02	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N° 76

FECHA: Martes 21/01/2025
CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE
FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE
FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO
ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

Entucito vertical, pateado de graderreros.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input checked="" type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	<input checked="" type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MANANA (6:00-11:59)		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
TARDE (12:00-17:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
NOCHE (18:00-23:59)					

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<u>01</u>	Residente de Obra	<u>01</u>	Maestro mayor	<u>02</u>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<u>01</u>	Ing Ambiental	<u>02</u>	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPERESNTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N° 77

FECHA: 11 Perceles 22/01/2025
CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE
FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE
FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO
ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Contrapiso de hormigón simple $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$, incluye mallo.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input type="checkbox"/>	Eq. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input type="checkbox"/>	Adamios
01	Concreteira	<input type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input type="checkbox"/>	Equipo de sold.
01	Vibrador	<input type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input type="checkbox"/>	Compresor	<input type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
MANANA (6:00-11:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

01	Residente de Obra	02	Maestro mayor	02	Albañil (es)	<input type="checkbox"/>	Soldador
01	Ing Ambiental	02	Peón (es)	<input type="checkbox"/>	Electricista	<input type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPERESNTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N° 78

FECHA: Jueves 23/01/2025
CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE
FISCALIZADOR: ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE
FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO
ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Picado de Piso
- Contrapiso de hormigón simple $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ incluye malla electrosoldada.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

X	Herramienta menor	-	Eqp. topográfico	X	Cono de seguridad	-	Adamios
01	Concreteira	-	Retro excavadora	X	Cinta de peligro	-	Equipo de sold.
01	Vibrador	-	Volqueta	X	EPP	-	-
-	Vibroapisonador	-	Bomba de agua	-	Compresor	-	-

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	X				
MANANA (6:00-11:59)		X			
TARDE (12:00-17:59)		X			
NOCHE (18:00-23:59)	X				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

01	Residente de Obra	01	Maestro mayor	02	Albañil (es)	-	Soldador
01	Ing Ambiental	02	Peón (es)	-	Electricista	-	Carpintero


6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:


ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA


ING. BRYAN L. VALIENTE C.
FISCALIZADOR


ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°- 79

FECHA: 09 / 05 / 2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADORA: ING. ANGELA G. SANCHEZ M.

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Preparación manual.
- Hormigón simple en replantillo $F=10cm$.
- Acero de refuerzo $f_y=4200 kg/cm^2$.
- B

2.- EQUIPO UTILIZADO:

X	Herramienta menor	-	Eqp. topográfico	X	Cono de seguridad	01	Adamios
01	Concretera	-	Retro excavadora	X	Cinta de peligro	-	Equipo de sold.
01	Vibrador	-	Volqueta	X	EPP	-	-
-	Vibroapisonador	-	Bomba de agua	-	Compresor	-	-

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)			X		
MANANA (6:00-11:59)				X	
TARDE (12:00-17:59)		X			
NOCHE (18:00-23:59)	X				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:



5.- PERSONAL EN OBRA:

01	Residente de Obra	01	Maestro mayor	02	Albañil (es)	-	Soldador
01	Ing Ambiental	02	Peón (es)	-	Electricista	-	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

Ejecución de contrato principal y complementario

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

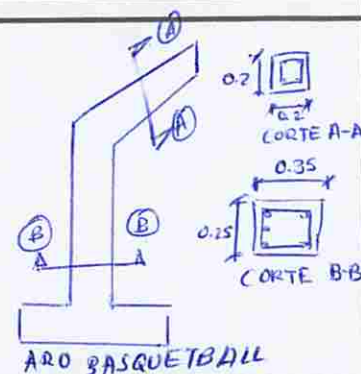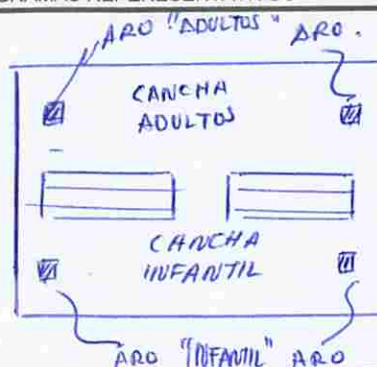

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. ANGELA G. SANCHEZ M.
FISCALIZADORA

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°-

80

FECHA: Sábado 10/05/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADORA: ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Acero de refuerzo $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$
- Hormigón simple $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ en planta (incluye encofrado)

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input type="checkbox"/>	Admisos
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	<input type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input type="checkbox"/>	Compresor	<input type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MANANA (6:00-11:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input type="checkbox"/>	Electricista	<input type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADORA

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°- 01

FECHA: Domingo 11/05/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADORA: ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Acero de refuerzo simple $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ en pilotes (incluye encastrado)
- Hormigón simple $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ en columna

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input checked="" type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	<input checked="" type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MANANA (6:00-11:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
TARDE (12:00-17:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPERESNTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADORA

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°-

02

FECHA: lunes 12/05/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADORA: ING. ANGELA G. SANCHEZ M.

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Hacerigón simple f'c= 210 Kg/cm² en columnas.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input checked="" type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	<input checked="" type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MANANA (6:00-11:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
TARDE (12:00-17:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPERESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. ANGELA G. SANCHEZ M.
FISCALIZADORA

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°- 93

FECHA: Martes 13/05/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADORA: ING. ANGELA G. SANCHEZ M.

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Relleno y compactado con material de mejoramiento
- Hissillado alisado de piso

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input checked="" type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	<input checked="" type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)					<input checked="" type="checkbox"/>
MANANA (6:00-11:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
TARDE (12:00-17:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
NOCHE (18:00-23:59)					<input checked="" type="checkbox"/>

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPERESNTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. ANGELA G. SANCHEZ M.
FISCALIZADORA

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°-

84

FECHA: MIÉRCOLES 14/05/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADORA: ING. ÁNGELA G. SÁNCHEZ M.

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Masillado, alisado de piso
- Canal colector AALL
- Bajante AALL PVC 160mm.
- Rejilla metálica para cuneta A=30cm.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input type="checkbox"/>	Concretera	<input type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input type="checkbox"/>	Vibrador	<input type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
MANANA (6:00-11:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:


<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input type="checkbox"/>	Electricista	<input type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:


Se autoriza elaboración de rejilla metálica mediante declaración solictada a la unidad de estudios y proyectos Informe Técnico Nro. 048-GADMT-STPL-VOPEP-2015 Ing. Mirta Grefa.

DIAGRAMAS REPERESNTATIVOS

Contratado



Ejecutado



4Ø12mm por cada espacio.

7.- OBSERVACIONES:

Reunión de documentación del contrato principal y contrato complementario para iniciar con la ejecución en obra.
Inicio de actividades una vez solventadas las causas por motivo de suspensión.

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. ÁNGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADORA

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°-

85

FECHA: lunes 15/05/2023
CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE
FISCALIZADORA: ING. ÁNGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO
ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Rejilla metálica para cuneta A=30cm.
- Empaste en paredes

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input checked="" type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	<input checked="" type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
MANANA (6:00-11:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPERESNTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. ÁNGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADORA

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°-

86

FECHA: Miércoles 16/05/2023

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADORA: ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Cubierta pre pintada estilpanel E=0.40mm area.
- Regilla metálica para ventana A=30cm
- Emparte en paredes
- Punto de tomacorriente 220v.
- Punto de tomacorriente 110v.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input type="checkbox"/>	Concretera	<input type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input type="checkbox"/>	Vibrador	<input type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
MANANA (6:00-11:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
TARDE (12:00-17:59)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)					

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

Se autoriza la ejecución de los rubros de costo t.v. según según partida presupuestaria autorizada por la dirección financiera.

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADORA

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°-

87

FECHA: Sábado 17/05/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADORA: ING. ANGELA G. SANCHEZ M.

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Empaste en paredes y cuellitas de columna.
- Pintura acrílica satinada exterior e interior
- Puesta a tierra varilla coprueld.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input checked="" type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	<input checked="" type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MANANA (6:00-11:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPERESNTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. ANGELA G. SANCHEZ M.
FISCALIZADORA

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°- 88

FECHA: Domingo 18/05/2025

CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

FISCALIZADORA: ING. ANGELA G. SANCHEZ M.

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO

ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Pintura acrílica satinada interior e exterior
- Luminaria LED HIGH BAY 150 WATTS
- Punto de iluminación con manguera poliet 1/2" y cable THHN. concentrico flexible #12.

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input checked="" type="checkbox"/>	Eq. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	04	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concretera	<input checked="" type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	-	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	-	-

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)					<input checked="" type="checkbox"/>
MANANA (6:00-11:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

01	Residente de Obra	01	Maestro mayor	01	Albañil (es)	=	Soldador
01	Ing Ambiental	01	Peón (es)	01	Electricista	=	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. ANGELA G. SANCHEZ M.
FISCALIZADORA

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°-

89

FECHA: lunes 10/05/2025
CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE
FISCALIZADORA: ING. ANGELA G. SANCHEZ M.
FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO
ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

Pintura acrílica para cancha.
- Señalización de cancha de basket e inter

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input type="checkbox"/>	Concretera	<input type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input type="checkbox"/>	Vibrador	<input type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input type="checkbox"/>	Compresor	<input type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MANANA (6:00-11:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
TARDE (12:00-17:59)			<input checked="" type="checkbox"/>		
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input type="checkbox"/>	Electricista	<input type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. ANGELA G. SANCHEZ M.
FISCALIZADORA

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

HOJA N°- 90

FECHA: Martes 20/05/2025
CONTRATISTA: ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE
FISCALIZADORA: ING. ÁNGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA MARIBEL GREFA SHIGUANGO
ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ

1.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Pintura acrílica para cancha
- Señalización de cancha de basket e indoor

2.- EQUIPO UTILIZADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta menor	<input checked="" type="checkbox"/>	Eqp. topográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	Cono de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Adamios
<input checked="" type="checkbox"/>	Concreteira	<input checked="" type="checkbox"/>	Retro excavadora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinta de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de sold.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>	Volqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	EPP	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vibroapisonador	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.- CONDICIONES CLIMATICAS:

	DESPEJADO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIOSO
MADRUGADA (00:00-5:59)	<input checked="" type="checkbox"/>				
MANANA (6:00-11:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
TARDE (12:00-17:59)		<input checked="" type="checkbox"/>			
NOCHE (18:00-23:59)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

4.- TRABAJOS NO EJECUTADOS POR EL CLIMA:

5.- PERSONAL EN OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Residente de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	Maestro mayor	<input checked="" type="checkbox"/>	Albañil (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Soldador
<input checked="" type="checkbox"/>	Ing Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	Peón (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricista	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpintero

6.- AUTORIZACIONES:

DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS

7.- OBSERVACIONES:

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. ÁNGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADORA

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL
