

Id	EDT	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																				
							S-2	M1 S-1	S1	S2	S3	M2 S4	S5	S6	S7	S8	M3 S9	S10	S11	S12	M4 S13	S14	S15	S16		
17	2.15		Mantenimiento c	15 días	sáb 27/05/23	sáb 10/06/23																				
18	2.16		Limpieza y Pintur	15 días	sáb 27/05/23	sáb 10/06/23																				
19	2.17		Limpieza y mante	7.5 días	lun 03/07/23	lun 10/07/23																				
20	2.18		Mantenimiento c	7.5 días	lun 03/07/23	lun 10/07/23																				
21	2.19		Puerta metalica c	7.5 días	lun 10/07/23	lun 17/07/23																				
22	2.20		Limpieza y mante	7.5 días	lun 03/07/23	lun 10/07/23																				
23	2.21		Sum. e Inst. de m	30 días	vie 07/07/23	dom 06/08/2																				
24	2.22		Sum. e Inst. de b	15 días	vie 07/07/23	sáb 22/07/23																				
25	2.23		Limpieza mecani	45 días	vie 12/05/23	dom 25/06/2																				
26	2.24		Retiro y reposici	15 días	dom 02/07/2	lun 17/07/23																				
27	2.25		Reposición de re	15 días	lun 19/06/23	lun 03/07/23																				
28	2.26		Retiro de recubri	7.5 días	mar 01/08/2	mié 09/08/23																				
29	2.27		Sum. e Inst. de C	7.5 días	mar 01/08/2	mié 09/08/23																				
30	2.28		Sum. e Inst. de Ju	7.5 días	mar 01/08/2	mié 09/08/23																				
31	2.29		Sum. e Inst. de Ju	7.5 días	mar 01/08/2	mié 09/08/23																				
32	2.30		Sum. e Inst. de Ju	7.5 días	mar 01/08/2	mié 09/08/23																				
33	2.31		Sum. e Inst. Puer	7.5 días	lun 10/07/23	mar 18/07/23																				
34	2.32		Mantenimiento y	7.5 días	vie 12/05/23	vie 19/05/23																				
35	3		ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE	38.5 días	vie 12/05/23	lun 19/06/23																				
36	3.1		Retiro de adoqui	7.5 días	vie 12/05/23	vie 19/05/23																				
37	3.2		Excavación manu	7.5 días	vie 12/05/23	vie 19/05/23																				
38	3.3		Hormigón f´= 18	7.5 días	vie 12/05/23	vie 19/05/23																				
39	3.4		Mampostería de	7.5 días	vie 12/05/23	vie 19/05/23																				
40	3.5		Acometida domic	7.5 días	vie 12/05/23	vie 19/05/23																				
41	3.6		Acometida domic	7.5 días	vie 12/05/23	vie 19/05/23																				
42	3.7		Enlucido de filos	7.5 días	vie 12/05/23	vie 19/05/23																				
43	3.8		Pintura de cauch	7.5 días	dom 11/06/2	lun 19/06/23																				
44	3.9		Mueble bajo mes	7.5 días	dom 11/06/2	lun 19/06/23																				
45	3.10		Punto de agua tu	7.5 días	vie 12/05/23	vie 19/05/23																				
46	3.11		Mesón de Hormi	7.5 días	vie 19/05/23	vie 26/05/23																				
47	3.12		Fregadero de Acc	7.5 días	vie 19/05/23	vie 26/05/23																				
48	3.13		Sum. e Inst. Sifón	7.5 días	vie 19/05/23	vie 26/05/23																				
49	3.14		Suministro e int.	7.5 días	vie 26/05/23	vie 02/06/23																				
50	3.15		Punto de aguas s	7.5 días	vie 12/05/23	vie 19/05/23																				
51	3.16		Punto de luz 80W	7.5 días	vie 19/05/23	vie 26/05/23																				
52	3.17		Punto de luz apli	7.5 días	vie 12/05/23	vie 19/05/23																				
53	3.18		Punto de tomacc	7.5 días	vie 12/05/23	vie 19/05/23																				
54	3.19		Luminaria led tip	7.5 días	vie 26/05/23	sáb 03/06/23																				
55	3.20		Luminaria led apl	7.5 días	vie 26/05/23	sáb 03/06/23																				

Proyecto: MANTENIMIENTO DE

Fecha: jue 03/08/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo


solo fin


Fecha límite

Tarea crítica

Progreso

Página 2

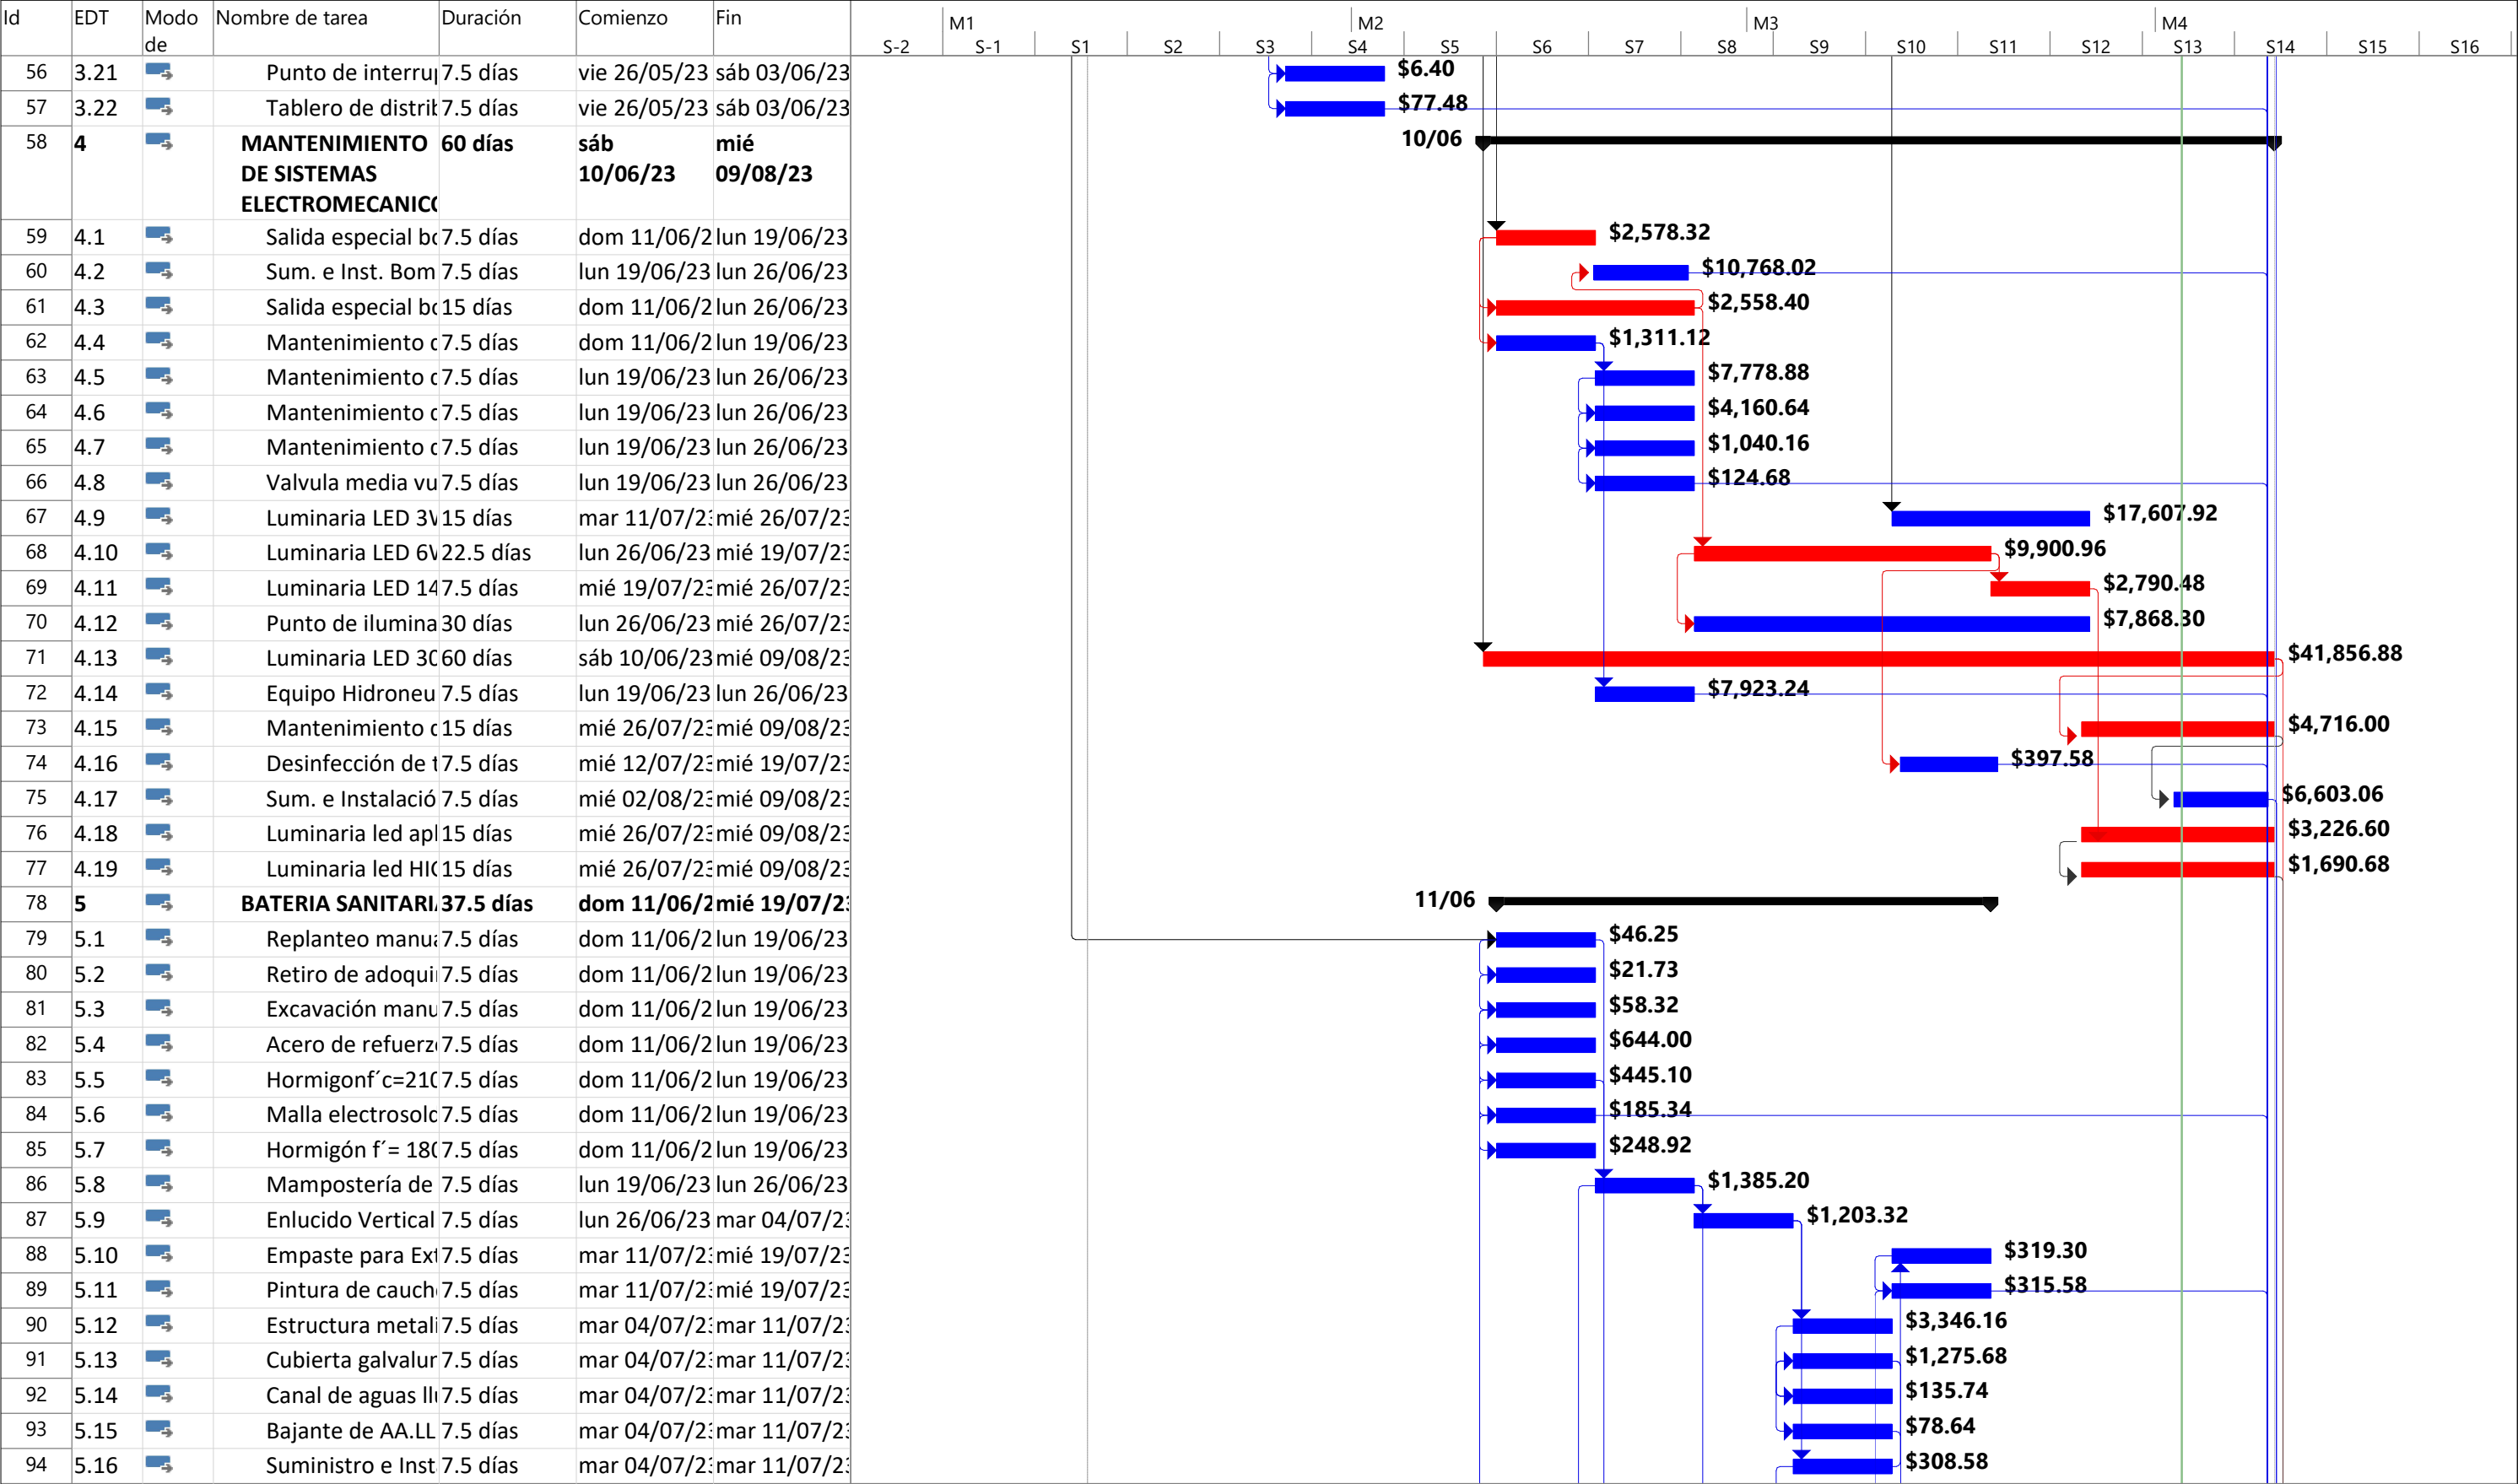

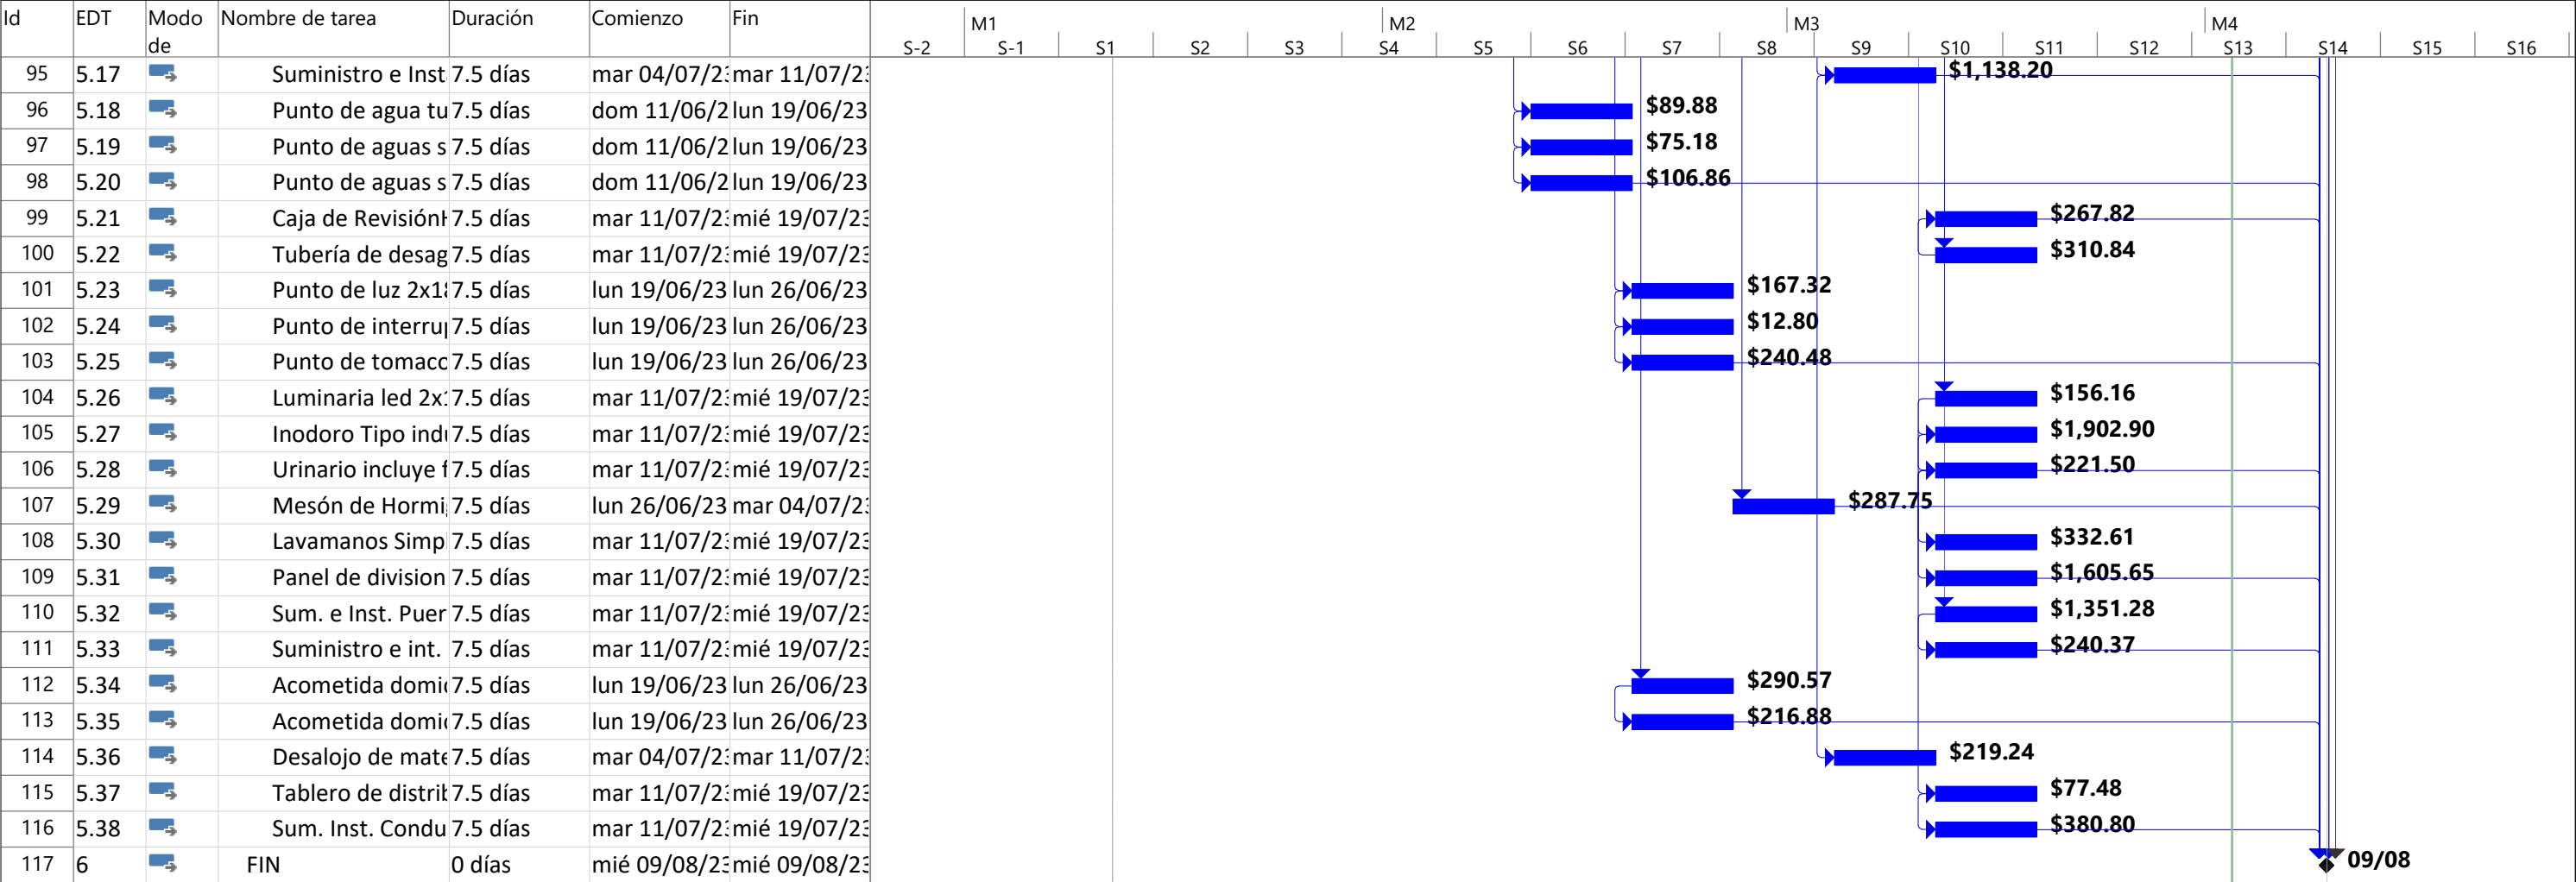

Proyecto: MANTENIMIENTO DE  
Fecha: jue 03/08/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Tarea crítica

Progreso

Página 4
